


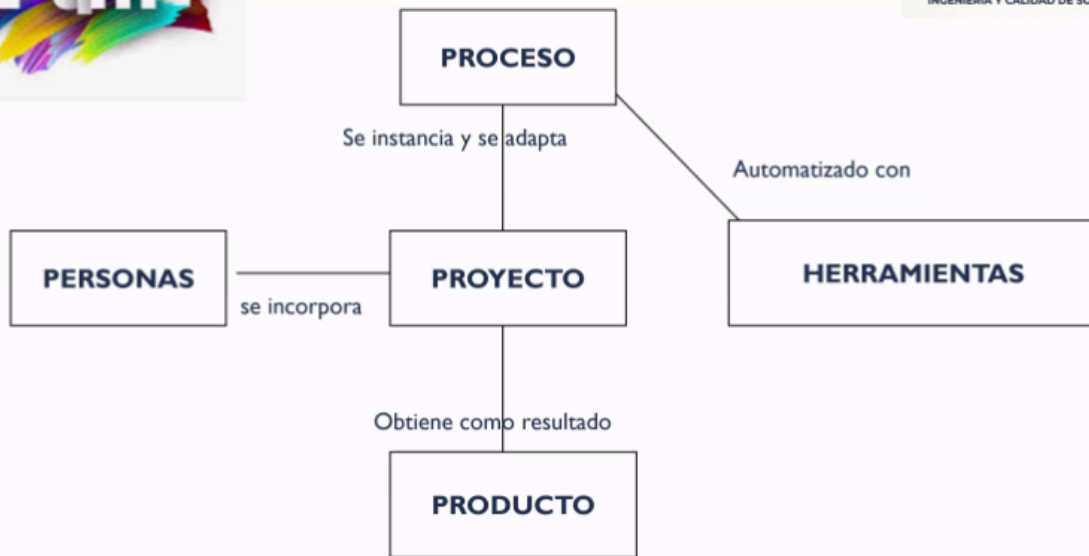

Tipos de proceso:

- Definido: seguir una serie de pasos y no adaptarse a cambios. Crean que se puede definir de antemano todo lo necesario para hacer sw. Repetibilidad. La experiencia puede extrapolarse a otros proyectos. Busca llegar a ser predecible con la experiencia del grupo
- Empírico: retroalimentación, encontrar y aprender. Actitud rápida para generar algo para el cliente y conseguir el feedback rápido

Dif entre proceso y ciclo de vida

Proceso: define las cosas que hay que hacer para hacer sw, entradas, salidas, roles que después van a cumplir las personas (después se puede adaptar a empresas grandes, pequeñas, etc), genéricos. Definición teórica de lo que hay que hacer para hacer sw
Ciclo de vida del proyecto/del desarrollo, determina cuánto de cada una de las actividades que dice el proceso vas a hacer en cada vez, puntos de control. Dice cómo usar el proceso en el contexto del proyecto. Puede ser de 3 tipos: iterativo, secuencial, recursivo. Para procesos empíricos, sólo se puede elegir el iterativo, porque el empirismo busca aprender de la propia experiencia del equipo, y al tener urgencia en obtener el feedback para aprender, se hacen iteraciones lo mas pequeñas que se pueda para generar conocimiento y ajustar lo que sea necesario para llegar al objetivo


Proyecto: unidad de gestión de trabajo que tiene un resultado único cada vez

Características:

- Resultado unico
- Duración limitada. Tiene que tener fecha de inicio y de fin. No es garantía de que vaya a cumplir ninguna de las 2. La idea como gestor de proyectos es cumplirlo, y sino tomar acciones para que se cumpla, pero en algún momento se tiene que cumplir
- Orientación a objetivos: dirigido a obtener resultados, lo que se refleja en objetivos. deben ser claros (todos entendemos lo mismo al ver lo que se define del proyecto),

alcanzable (haciendo lo que sabemos todos podemos cumplir los objetivos). Puede haber objetivos claros pero no alcanzables y viceversa

- Tareas interrelacionadas basadas en esfuerzos y recursos: manera en la que manejamos la complejidad. Dividimos el proyecto en tareas interrelacionadas con objetivos parciales que al confluir logran el objetivo que buscamos

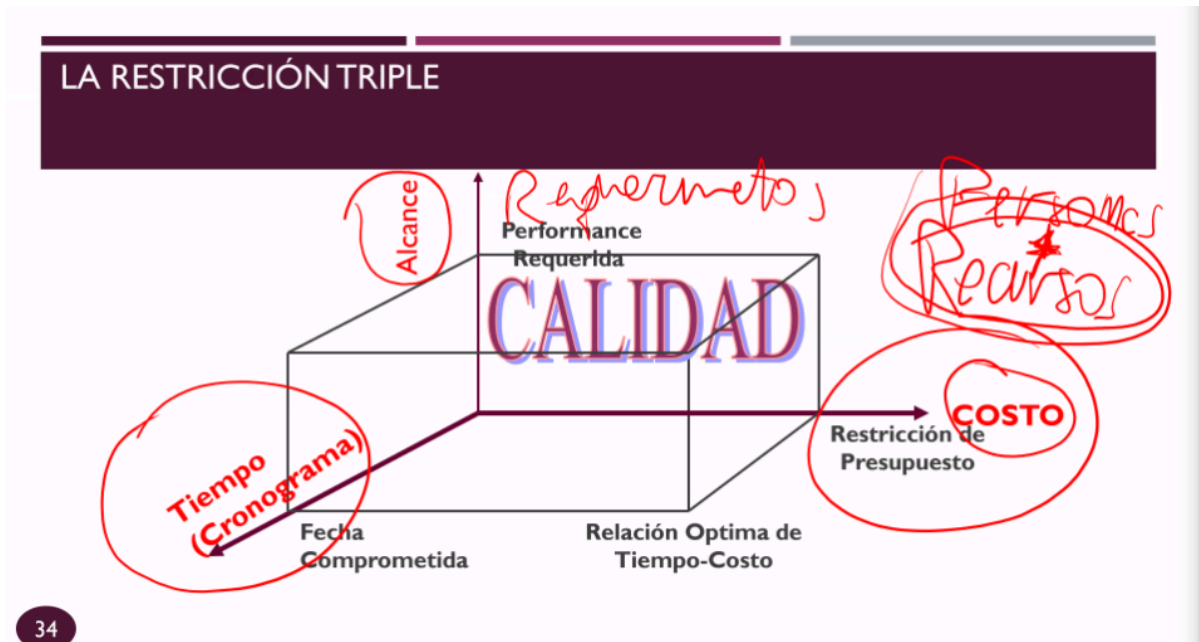

La única variable que debería controlar el cliente es lo que quiere y necesita. Nos tiene que decir lo que necesita/quiere

No debemos permitir que el cliente controle las 3 variables
